

INTRODUCCIÓN

A corte 30 de junio del 2019 se contó con una apropiación en el presupuesto de inversión de \$35.750.445.936 millones, distribuidos en catorce (14) proyectos, de los cuales la Oficina de Desarrollo y Planeación dio viabilidad a catorce (14) proyectos. Para este mismo periodo expidieron disponibilidades presupuestales por \$4.757.012.259 millones y un total de acumulado de compromisos de \$3.361.896.171 millones, equivalente a una ejecución presupuestal (acumulado Disponibilidad) del 13 %. El desagregado de la ejecución presupuestal por proyecto se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Balance presupuestal de inversión vigencia 2019 (sobre disponibilidades), a corte 30 de junio

Concepto	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Ejecución Financiera porcentaje
Reestructuración orgánica y normativa	\$ 67.310.503	\$ 10.436.418	15%
Fortalecimiento de la Investigación	\$ 1.827.852.489	\$ 788.063.097	43%
Educación Inclusiva	\$ 1.282.053.626	\$ 397.380.704	31%
Desarrollo del Campus Universitario proyecto Valmaría	\$ 26.447.860.950	\$ 105.369.962	0,40 %
Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos.	\$ 1.448.309.354	\$ 634.278.763	44%
Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica.	\$ 1.784.019.784	\$ 1.226.779.765	69%
Dotación de Biblioteca	\$ 267.477.147	\$ 114.612.895	43 %
Renovación del Parque Automotor de la UPN	\$ 363.984.953	\$ 321.450.139	88%
Formación y cualificación docente.	\$ 900.000.000	\$ 311.469.232	35%
Sistema de publicaciones y difusión del conocimiento.	\$ 344.011.077	\$ 232.467.570	68%
Fortalecimiento de las comunicaciones y los recursos educativos.	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	99,6%
Bienestar para todas y todos.	\$ 332.700.000	\$ 166.948.697	50%
Ampliación de la movilidad de profesores y estudiantes	\$ 641.490.981	\$ 422.755.012	66%
Conocimiento Ambiental y Currículo	\$ 18.375.072	\$ 0	0 %
Totales	\$ 35.750.445.936	\$ 4.757.012.259	13%

Fecha de corte. 30 de Junio del 2019

Fuente: Sistema de Información Financiera - GOOBI

El porcentaje de ejecución financiera total es bajo, dado que se tuvo en cuenta el proyecto de “Desarrollo del Campus Universitario proyecto Valmaría” lo cual hace que la ejecución sea baja, pues dicho proyecto sigue incorporando recursos y se continua con las gestiones, pero a la fecha de corte por trámites administrativos no se ha contado con los requisitos para poder proceder con los permisos de construcción.


Así mismo, se indica que en este informe no se incluye la partida proyectada en virtud del acuerdo entre el Presidente de la República y los Rectores del SUE para inversión, estimada en \$6.575.450.145 para la Universidad Pedagógica Nacional, ya que en el párrafo único del artículo 6 del Acuerdo No. 038 del 2018, se estableció que la distribución de los recursos de inversión, estaba sujeta a la expedición del acto



administrativo de distribución y giro de dichos recursos, por parte del Gobierno Nacional. De lo anterior, se tiene que los \$850.000 millones de inversión, establecidos en el numeral 7 del acta de la Mesa de Dialogo para la construcción de acuerdo para la educación superior de del 14 de diciembre del 2018, serán distribuidos entre las IES oficiales entre el 2019 al 2022, a través de la figura de los Planes de Fomento a la Calidad y que el valor para la UPN en el 2019 será inferior al apropiado en el presupuesto de la vigencia 2019.

En la gráfica 1, se presenta por proyecto la relación entre el valor apropiado y los compromisos adquiridos, sin incluir los recursos Inversión Recurso SUE-Resolución 016862 del 201 MEN ni el proyecto “Valmaría”.

Gráfica 1. Ejecución proyectos de inversión – 2019

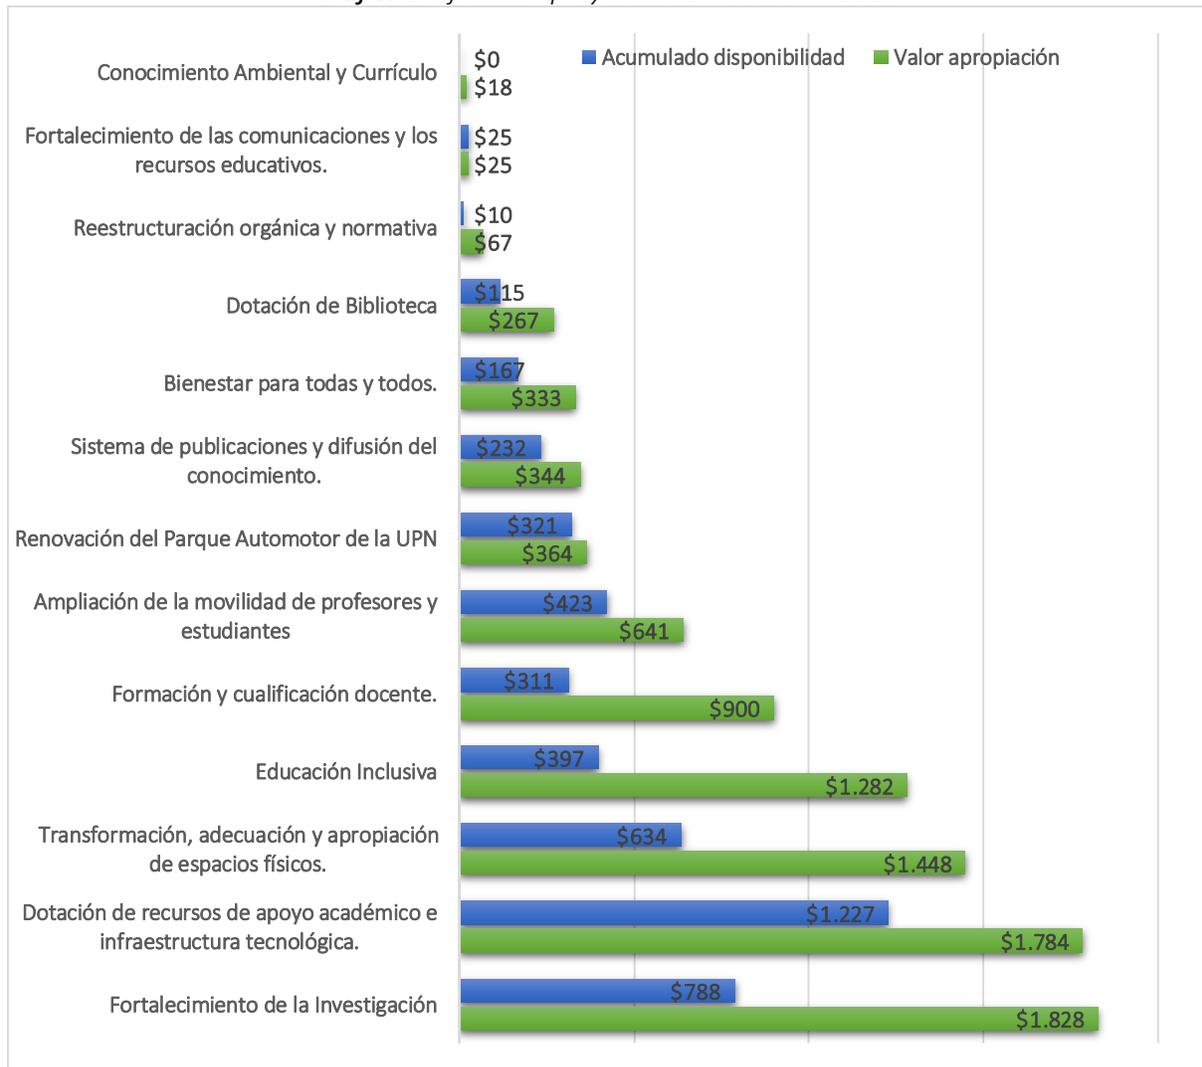

Fecha de corte. 30 de junio del 2019

Fuente: Sistema de Información Financiera - GOOBI

A continuación, se muestra la ficha de resumen de seguimiento por proyecto de inversión, en el cual se relaciona el avance físico (avance en el cumplimiento de las metas y acciones) reportado por los Centros de Responsabilidad, así como la ejecución financiera arrojada por el Sistema Financiero GOOBI a corte 30 de junio de 2019. En el grafico no se incluyó el proyecto de Valmaría por lo anteriormente mencionado.



1. INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de las comunicaciones y los recursos educativos.	CÓDIGO:	410.705.1.7.3	
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: Docencia, Investigación y Proyecto Social			
PROGRAMA DEL PDI:	Apropiación Social del conocimiento y comunicación institucional.			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional como líder en la Formulación de propuestas educativas y pedagógicas para la construcción de una sociedad en paz con justicia y democracia			
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Fortalecer la comunicación institucional dinamizando los modos, prácticas y relaciones al interior de la comunidad universitaria, y liderando el dialogo entre la Universidad y los distintos actores sociales.			
FECHA DE VIABILIDAD	2019/01/02	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a junio 30 de 2019	
COORDINADOR	Ricardo Agudelo Suarez			
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	Rectoría			
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA				1

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1 Promocionar los servicios y actividades académicas, de extensión e investigación, así como los programas ofertados por la universidad. Divulgar las acciones y actividades administrativas que se emprendan en cumplimiento del PDI.	Meta 1: 100% de plegables, afiches y demás materiales promocionales de servicios académicos, de extensión e investigación solicitados por dependencias académicas y administrativas, finalmente producidos.	100%	100%	100%

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)
	99,60%

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 24.900.398	\$ 0	\$ 0
10.02	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 24.900.398	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIÓN:

La ejecución Física del proyecto a 30 de Junio de 2019 es del 100%, con un cumplimiento financiero del 99,60% tomando como referente el total de compromisos para el segundo trimestre de 2019. Por lo que, su objetivo se ha cumplido y terminado satisfactoriamente la ejecución del proyecto.



1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	Conocimiento ambiental y currículo	CÓDIGO:	410.705.4.1.1
EJE DEL PDI:	Universidad y sustentabilidad ambiental		
PROGRAMA DEL PDI:	Formación Ambiental		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Articular las problemáticas educativas, sociales y políticas de modo que contemplen el respeto a las culturas y la protección del ambiente		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Articular la dimensiones ambiental a los programas curriculares de pregrado y posgrado de la universidad		
FECHA DE VIABILIDAD	2019/12/06	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a junio 30 de 2019
COORDINADOR	Lyda Constanza Mora Medina		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	1		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS

SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019

Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1: Desarrollar la cátedra Ambiental como espacio de formación ambiental	Meta 1: Realizar 4 sesiones de Cátedra Ambiental	37 %	37 %	43 %
Objetivo 2: Elaborar un plan de formación ambiental para favorecer la incorporación de principios, criterios y valores ambientales en programas curriculares de pregrado, basados en sustentabilidad.	Meta 1: Elaborar un documento con el plan de formación ambiental.	50%	50%	

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)

0%

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 18.375.072	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10.02	\$ 18.375.072	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIÓN:

La ejecución Física del proyecto a 30 de Junio de 2019 es del 43% se ha efectuado cumplimiento a través de la meta 1 con el desarrollo de cuatro (4) sesiones de Catedra Ambiental y frente al objetivo dos (2) se tiene un borrador y documento que se está trabajando. La ejecución financiera ha sido del (0%), pues se adelantaron la elaboración de documentos y las cátedras con recursos de funcionamiento. Para el tercer y cuarto trimestre se continuara con la implementación.



1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	Reestructuración Orgánica y Normativa	CÓDIGO:	410.750.1.1.2.
EJE DEL PDI:	Articulación y Reposicionamiento de compromisos misionales: Docencia, Investigación y Proyección Social		
PROGRAMA DEL PDI:	Maestros con Excelencia y Dignidad		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la universidad para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Fortalecer los procesos institucionales en el aspecto normativo y la ejecución de sus actividades, garantizando el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad.		
COORDINADOR	YANETH ROMERO COCA		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	RECTORÍA		
FECHA DE VIABILIDAD	06/05/2019	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	DE Enero a junio 30 de 2019
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA		1	

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS

SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019

Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1: Actualizar las normas de la Universidad Pedagógica Nacional	Meta 1: Actualizar el estatuto General de la Universidad Pedagógica Nacional.	70%	50%	50%
	Meta 2: Actualizar el acuerdo de Estructura Orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional.	60%		
	Meta 3: Revisar y actualizar las normas del Sistema de Gestión de calidad, en especial la articulación con el MECL.	20%		

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD) 15 %

Este proyecto presenta la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 67.310.503	\$ 10.436.418	\$ 10.168.249	\$ 0	\$ 0
10.02	\$ 45.000.000	\$ 10.347.532	\$ 10.168.249	\$ 0	\$ 0
21.10.02	\$ 22.310.503	\$ 88.886	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIÓN:

La fecha de Viabilidad de este proyecto para lo que corresponde a la vigencia 2019 fue el 06/05/2019, sin embargo, el Comité de reformas de que trata las Resoluciones 004 de 2017 y 358 de 2018 sesionó en el primer semestre de 2019, en tres ocasiones, logrando articular acciones en torno a la revisión del proyecto de Acuerdo para el nuevo Estatuto General y la estructura orgánica. En la ejecución financiera se adelantó en el acumulado compromiso el 15% del total del proyecto que para el segundo semestre se ejecute en relación con la vinculación de un profesional que apoye la revisión y el ajuste técnico de las propuestas.



1. INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de la Investigación		CÓDIGO:	410.705.1.2.2
EJE DEL PDI:	Eje 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social			
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 2. Horizonte para la Acreditación Institucional			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro papel como interlocutora del gobierno nacional en la definición y desarrollo de políticas educativas			
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Articular las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social mediante el fortalecimiento de los grupos de investigación y de las estrategias de formación en el marco de las convocatorias de investigación internas de la SGP–CIUP y de las convocatorias que se realicen en articulación con otras instituciones de educación superior o las llevadas a cabo por entidades como Colciencias.			
FECHA DE VIABILIDAD	2019/01/29	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a Junio de 2019	
COORDINADOR	María Isabel González Torrerros			
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA			
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA			5	

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1: Realizar convocatorias internas de investigación que potencien la producción y circulación de conocimiento de las Unidades Académicas y se articule con la SGP-CIUP.	Meta 1: Seguimiento y ejecución de 32 propuestas de investigación. 31 aprobadas en la convocatoria 2019 que se abrió en el mes de agosto de 2018, y uno que estaba aplazado de la convocatoria 2017	55%	35%	47%
	Meta 2: Diseño y desarrollo de la convocatoria interna de investigación 2020	15 %		
Objetivo 2: Desarrollar dos estrategias de acompañamiento a los grupos de investigación de la Universidad, que favorezca su cualificación	Meta 1: Acompañamiento de la SGP-CIUP a los grupos de investigación para participar en las Convocatorias de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de			



	<p>Ciencia y Tecnología e innovación- SNCT Tel, 2018, que periódicamente realiza Colciencias.</p> <p>Meta 2: Realizar un evento para socializar y discutir los resultados de investigación de los grupos de la Universidad, especialmente en la de las investigaciones producto de las convocatorias internas que contribuyan a fortalecer los grupos y a ampliar la incidencia de investigación que se realiza en la Universidad</p>	20%		
<p>Objetivo 3: Consolidar dos modalidades de formación en investigación y su articulación con las estrategias formativas de los grupos de investigación y los programas académicos.</p>	<p>Meta 1: Realización de dos convocatorias dirigidas a los estudiantes para que participen como monitores en proyectos de investigación, en las revistas indexadas de la UPN y en las actividades académicas de la SGP-CIUP.</p>	40%	40%	
	<p>Meta 2: Seguimiento y desarrollo de 6 semilleros y 1 grupo infantiles y juveniles aprobados en la convocatoria de 2018 que se ejecutara en 2019</p>	40%		
<p>Objetivo 4: Desarrollar propuestas conjuntas con otros actores del sistema educativo y de ciencia y tecnología para el desarrollo de propuestas conjuntas de investigación, a través de la suscripción de al menos 2 convenios anuales.</p>	<p>Meta 1: Cualificar las condiciones institucionales para acompañar a los grupos de investigación que se presenten a las convocatorias externas</p>	60%	59%	
	<p>Meta 2: Gestión técnica y financiera de los convenios y contratos de investigación que se vienen adelantando desde años anteriores o que se encuentran vigentes.</p>	65%		
	<p>Meta 3: Gestión técnica y financiera con entidades externas para la</p>	50%		



	liquidación de contratos y convenios de vigencias anteriores			
	Meta 4: Elaboración y desarrollo en diferentes modalidades para financiar proyectos de investigación de grupos del Sistema Universitario-Estatal Distrito Capital	60%		

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)	43%
--	--	------------

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 1.827.852.489	\$ 788.063.097	\$ 768.226.516	\$ 182.400.594	\$ 181.296.544
10.02	\$ 749.575.908	\$ 372.669.757	\$ 361.016.082	\$ 136.386.891	\$ 135.282.841
20.04	\$ 573.366.496	\$ 260.567.217	\$ 254.297.467	\$ 42.872.661	\$ 42.872.661
21.10.02	\$ 323.424.092	\$ 68.787.852	\$ 67.542.190	\$ 42.880	\$ 42.880
21.16.16	\$ 24.202.660	\$ 10.952.803	\$ 10.856.379	\$ 0	\$ 0
21.16.17	\$ 146.752.160	\$ 67.253.023	\$ 66.681.954	\$ 13.600	\$ 13.600
21.20.04	\$ 10.531.173	\$ 7.832.444	\$ 7.832.444	\$ 3.084.562	\$ 3.084.56

OBSERVACIÓN:

Se evidencia que los siguientes factores se deben tener en cuenta para la ejecución del tercer y cuarto trimestre de 2019:

Para el desarrollo de la meta 1 del objetivo 1, se están ejecutando treinta y dos (32) proyectos internos de investigación, de los cuales treinta y uno (31) corresponden a la convocatoria 2019 y un (1) que se encontraba aplazado de la convocatoria 2018. Los proyectos se encuentran divididos de la siguiente manera: veinticinco (25) proyectos internos, seis (6) semilleros y un (1) grupo infantil y juvenil.

La ejecución financiera de los proyectos Internos, semilleros, grupo infantil y juvenil se dará para el segundo semestre del año en curso, pues en primer semestre se daba cumplimiento a la formulación, planeación y vinculación de los mismos.

En el Objetivo 2 meta 2, ligada al evento de socialización de la investigación que se hace en la Universidad, donde se busca presentar los avances de los profesores y estudiantes, se encuentra en fase de planeación para poder realizar la semana de la investigación CIUP en el segundo semestre del 2019.

En la meta 4 del objetivo 4, se realizó invitación privada a proyectos de Investigación que obtuvieron un puntaje de superior a 65 puntos en la segunda convocatoria de SUE 2018. En el mes de abril se envían cartas de aprobación de recursos de las otras universidades para la financiación de estos proyectos y junto a la mesa de investigaciones del SUE se definieron los trámites para dar inicio a dichos proyectos en el mes de agosto de 2019.

Se brindó apoyo a los grupos de investigación que participarían en la convocatoria de medición de grupos 833 de 2018 y a otras convocatorias, con el propósito de acceder a la financiación de proyectos por parte de Colciencias y de la Universidad de Brasil.

Se logró la aprobación de la política de investigación de la universidad la cual se encuentra establecida en el Acuerdo 13 de 2019 expedido por el Consejo Superior Universitario.

El CIUP señala que dentro de la ejecución de gastos generales se incluye un presupuesto de \$90.000.000 que pertenece a una caja menor que no se va ejecutar.

La ejecución física fue del 47% y su ejecución financiera del 43% este proyecto en Tercer y cuarto trimestre del año 2019 tendrá una fase de ejecución que permitirá cumplir en mayor medida los objetivos.

1. INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE DEL PROYECTO:	Educación Inclusiva	CÓDIGO:	410.705.1.2.3	
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales. docencia, investigación y proyecciones			
PROGRAMA DEL PDI:	Horizonte de la acreditación institucional			
OBJETIVO GENERAL	Diseñar estrategias y dinámicas que favorezcan la ampliación de los logros generados en la disminución de la deserción, y la motivación a la permanencia y graduación de los estudiantes en el marco de la educación inclusiva.			
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA VIGENCIA	Implementar una estrategia de acompañamiento psicosocial, evidenciada en apoyo psicosocial, pedagógico, formación en lenguas extranjeras e incentivos económicos que disminuyan la deserción, motiven la permanencia y graduación.			
FECHA DE VIABILIDAD	2019/03/19	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a junio 30 de 2019	
COORDINADOR	Lida Constanza Mora Mendieta			
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA			
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	1			

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1: Implementar una estrategia de acompañamiento psicosocial.	Meta 1: Un programa de acompañamiento psicológico implementado.	66%	66%	55%
	Meta 2: Un programa de acompañamiento pedagógico implementado que dé cuenta del fortalecimiento de habilidades para el mejor rendimiento académico.	66%		



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
	Meta 3: Una estrategia de acompañamiento psicosocial dirigido a estudiantes titulares de monitorias académicas	66%		
	Meta 4: Una estrategia psicoeconómica implementada dirigida a estudiantes de la UPN	66%		
Objetivo2: Dar continuidad al Seminario de formación en lenguas extranjeras en los idiomas de inglés, francés y portugués, orientado a docentes en ejercicio y docentes en formación con el ánimo de dar respuesta a la necesidad de cualificar el nivel de dominio de un idioma extranjero en los estudiantes de la UPN.	Meta 1: Ofrecer un (1) nivel de formación al semestre en la vigencia 2018, para estudiantes de pregrado y profesores de la Universidad.	50%	50%	
	Meta 2: Entregar un documento final del proceso ejecutado en la vigencia 2019.	50%		
Objetivo 3: Apoyar con recursos de hasta dos (2) SMMLV por semestre a los estudiantes matriculados de las comunidades pertenecientes a la Zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana- RSDJ para permitir el sostenimiento de los programas de educación superior de la Universidad Pedagógica Nacional.	Meta 1: Seleccionar 400 estudiantes como beneficiarios del convenio 505 de 2019 UAESP-UPN para la vigencia 2019	50%	50%	

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)		31 %	
Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 1.282.053.626	\$ 397.380.704	\$ 204.453.361	\$ 83.484.841	\$ 83.484.841
10.02	\$ 6.624.928	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	\$ 300.000.000	\$ 149.636.662	\$ 87.104.678	\$ 34.904.678	\$ 34.904.678
20.04	\$ 761.550.771	\$ 72.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.10.02	\$ 126.309.515	\$ 108.050.415	\$ 76.261.743	\$ 48.499.029	\$ 48.499.029
21.16.02	\$ 158.850	\$ 158.850	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.16.16	\$ 1.046.455	\$ 1.046.455	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.16.17	\$ 86.363.107	\$ 66.488.322	\$ 41.086.939	\$ 81.133	\$ 81.133

OBSERVACIÓN:

La ejecución física del proyecto se encuentra al (55 %), avance que está acorde con las actividades planteadas dentro del proyecto de inversión, relacionadas con la implementación de la estrategia de acompañamiento psicosocial, psicológico y económico (monitorias) durante el primer semestre del 2019, así como el desarrollo del Seminario de formación en lenguas extranjeras, y lo establecido en el convenio suscrito con la Unidad Especial del Servicios Públicos – UAESP.

La ejecución financiera es de (31 %). Es importante indicar que el valor total solicitado en la ficha de inversión es inferior a la apropiación presupuestal en \$24.131.705, que corresponden a los recursos asignados por la Unidad Especial del Servicios Públicos – UAESP.

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Desarrollo del Campus Universitario proyecto Valmaría	CÓDIGO:	410.705.1.3.1
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Una casa digna		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Garantizar las condiciones óptimas del as planta física y dotación adecuada , tomando como principal proyecto la construcción el nuevo campus universitario Valmaría		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Adelantar los procesos administrativos y técnicos necesarios para la construcción de la nueva sede de la Universidad Pedagógica Nacional, en el predio denominado Valmaría y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura física acorde a las necesidades de la universidad.		
FECHA DE VIABILIDAD	28/03/2019	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a junio 30 de 2019
COORDINADOR	Alexander Moreno Cárdenas		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ADMISNITRATIVA Y FINANCIERA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	1		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1: Adelantar las gestiones técnicas y administrativas para la obtención de la licencia de construcción del edificio de aulas y oficinas, y construcción del restaurante	Meta 1: Radicar planos arquitectónicos y diseño estructural en la Curaduría para la obtención de la licencia de construcción del edificio de aulas y oficinas, y construcción del restaurante.	50%	50%	13%
Objetivo 2: Elaborar los estudios de Ingeniería y diseños estructurales para la Fase No. 2 del proyecto Valmaría.	Meta 1: Concurso de méritos para contratar los Estudios de Ingeniería y diseños estructurales para la Fase No. 2 del proyecto Valmaría.	5%	5%	
Objetivo 3: Construir la Fase No. 1 etapa 1 del proyecto Valmaría.	Meta 1: Iniciación proceso de construcción.	5%	5%	
	Meta 2: Iniciación interventoría a la construcción de las obras de la fase 1 de la etapa 1.	5%		



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 4: Ejecutar las obras para la adecuación de la infraestructura actualmente en uso en el predio Valmaría	Meta 1: Cerramiento del predio Valmaría	5%	5%	
Objetivo 5: Ejecutar las obras para la adecuación, renovación y remodelación de los espacios físicos del predio Valmaría	Meta 1: Adecuaciones generales de infraestructura física de los predios de la UPN	0%	0%	

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)	0,40%
---------------------------------	---	-------

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 26.447.860.950	\$ 105.369.962	\$ 252.387	\$ 252.387	\$ 252.387
21.26.01	\$ 18.830.183.828	\$ 75.020.652	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.26.02	\$ 1.617.677.122	\$ 6.444.928	\$ 252.387	\$ 252.387	\$ 252.387
26	\$ 6.000.000.000	\$ 23.904.382	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIÓN:

La baja ejecución en materia presupuestal (0,40%) y física (13%) del proyecto Valmaría, es producto de los trámites administrativos ante el gobierno Distrital, sin los cuales no es posible retomar las gestiones para obtener la licencia de construcción.

Dado que el predio de Valmaría pertenece al sector de Lagos de Torca, por lo cual fue afectado por el Decreto 088 del 3 de marzo de 2017, que fue modificado por el Decreto 049 del 23 de enero de 2018. Bajo ese marco legal determinado por el Distrito, el proyecto no podía ser tramitado por las curadurías urbanas hasta que no se efectuase la entrega material del área de cesión gratuita correspondiente a la Av. Las Villas

El 13 de junio de 2017, se radicaron los documentos para el trámite de la Licencia de Construcción ante la Curaduría No. 2. Frente a la vía de Av. Las Villas por parte del distrito se efectúa la localización y replanteo de 600 ml de vía y materialización en terreno de las coordenadas mediante mojones en concreto (0.30mts x 0.30mts xmts). Frente a lo cual la universidad ya cumplió con el requerimiento de la cesión de los predios.

De la ejecución financiera se resalta que se efectuó un pago por un valor de \$252.387,37 correspondiente a un gravamen financiero que respalda los pagos de las cuentas por pagar y reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre del 2018.



1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos.	CÓDIGO:	410.705.1.3.2
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	1.3. Una casa digna		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Contribuir al mejoramiento integral de la planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes y a los requerimientos de las labores de docencia e investigación		
FECHA DE VIABILIDAD	26/03/2019	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a junio 30 de 2019
COORDINADOR	Alexander Moreno Cárdenas		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	03		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1: Ejecutar las obras para la adecuación, renovación y remodelación de los espacios físicos de la Universidad.	Meta 1: Adecuación en el bloque E segundo piso para el Centro Cultural, librería y sala para Pares Académicos.	10%	23 %	23%
	Meta 2: Adecuaciones generales de infraestructura física de los predios de la UPN	10%		
	Meta 3: Adicionar el contrato No 862 de 2018 que tiene por objeto "Contratar las adecuaciones generales de la infraestructura física de la Casa de Biología del predio ubicado en la calle 72 No. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional"	50%		



3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)		44 %	
Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 1.448.309.354	\$ 634.278.763	\$ 138.815	\$ 138.815	\$ 138.815
10.02	\$ 312.176.396	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10.03	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.10.02	\$ 738.229.357	\$ 247.375.165	\$ 107.367	\$ 107.367	\$ 107.367
21.16.02	\$ 129.314	\$ 129.313	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.16.03	\$ 156.466.093	\$ 156.466.092	\$ 21.598	\$ 21.598	\$ 21.598
21.16.16	\$ 1.327.600	\$ 1.327.599	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.17.01	\$ 10.645.101	\$ 10.645.100	\$ 9.850	\$ 9.850	\$ 9.850
21.17.02	\$ 1.594.905	\$ 1.594.904	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.20.06	\$ 227.740.588	\$ 216.740.587	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIÓN:

Respecto al avance físico del proyecto con corte a 30 de Junio es del (23%) objetivo 1, frente las adecuaciones generales, se tiene lo siguiente:

En la meta 1: Se busca Adecuación en el bloque E segundo piso para el Centro Cultural, librería y sala para Pares Académicos frente a lo cual en el periodo se dio apertura al proceso de Convocatoria Pública No. 3.

En la meta 2: Se encuentra en la fase precontractual para realizar las adecuaciones generales del espacio académico relacionados a continuación: San José de Villeta, adecuaciones físicas de la portería de acceso peatonal sobre la calle 72, adecuaciones generales a los componentes de las calderas de piscina y restaurante de la UPN, adecuación de los espacios físicos para el almacenamiento de bienes y otros elementos, elaboración de diseños y presupuestos para adecuaciones generales de infraestructura física de los predios de la UPN, de acuerdo a los lineamientos del Comité Directivo.

En la meta 3 : Se realizó la solicitud para Adicionar el contrato No 862 de 2018 que tiene por objeto “Contratar las adecuaciones generales de la infraestructura física de la Casa de Biología del predio ubicado en la calle 72 No. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional”.

La ejecución física ha sido baja pues la mayoría de procesos se encuentran en la fase precontractual para el tercer y cuarto trimestre del año en curso se debe dar celeridad a la contratación y ejecución.

La ejecución financiera es del 44 % tomando como referente las disponibilidades presupuestales, aclarando que a 30 de junio del 2019 no existen compromisos.



1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica.	CÓDIGO:	410.705.1.4.1
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Recursos de apoyo académico		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura (física y tecnológica), los procesos administrativos y de gestión de la Universidad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Renovar, consolidar y fortalecer la Plataforma Tecnológica y Física de la Universidad Pedagógica Nacional para contribuir al logro de una Gestión Académico - Administrativa eficiente, con identidad institucional, a través de la incorporación de las nuevas tecnologías, garantizando el desarrollo eficaz en las labores de la docencia, investigación y demás actividades académico-administrativas a través de la mediación tecnológica, orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas.		
FECHA DE VIABILIDAD	26/03/2019	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a junio 30 de 2019
COORDINADOR	CESAR MAURICIO BELTRÁN LÓPEZ - Subdirector de Gestión de Sistemas de Información		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	1		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1: Mejorar los sistemas de información mediante la adquisición de nuevos aplicativos, brindando mayor funcionalidad y cobertura a las unidades académicas, administrativas y procesos institucionales y demás licenciamientos que se requieran para los servicios académicos-administrativos de la Universidad	Meta 1: Cubrir el pago de la vigencia futura -2019 correspondiente al Sistema de Información para la Gestión Académica de la Universidad Pedagógica Nacional, autorizado mediante Acuerdo No. 008 de 2017 y 016 de 2017 del Consejo Superior.	63%	62%	40%
	Meta 2: Cubrir el pago de la Vigencia Futura-2019 correspondiente a la Interventoría para el nuevo sistema de información para la gestión académica, autorizado mediante Acuerdo No. 008 de 2017 y 016 de 2017 del Consejo Superior.	64%		
	Meta 3: Adquirir Software y Licencia para los servicios académicos de la Universidad y el IPN. -Licencias Software Atlas TI	60%		



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
	-Antivirus -Licencias Software TOAD -Adobe - Paquete estadístico SPSS PALA.			
Objetivo 2: Adquirir equipos de cómputo para disminuir el grado de obsolescencia del parque computacional de la Universidad Pedagógica Nacional.	Meta1: Adquirir computadores hasta por el valor del excedente asignado y destinarlos a las dependencias que han realizado solicitudes de requerimientos de equipos de cómputo.	25%	25%	
Objetivo 3: Diseño e Implementación de una solución de Comunicaciones	Meta1: Contratar la prestación del servicio integral de CONECTIVIDA, CANAL DE DATOS, INTERNET DEDICADO y WIFI a nivel central y a nivel sedes, con los equipos básicos de enrutamiento y/o configuraciones adicionales sobre la plataforma tecnológica de la Universidad Pedagógica Nacional para garantizar la continuidad y calidad del servicio de comunicaciones.	50%	50%	
Objetivo 4: dotar de equipos informáticos, audiovisuales y mobiliario para los programas académicos, de la Universidad, de acuerdo con las necesidades reportadas y priorizadas.	Meta 1: Adquirir equipos informáticos, audiovisuales y mobiliario para la labor académica de las facultades de Facultad de Bellas Artes, Educación Física, Facultad de Humanidades, Facultad de Educación y la Facultad de Ciencia y Tecnología.	25%	25%	

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)	69 %
---------------------------------	---	------

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 1.784.019.784	\$ 1.226.779.765	\$ 1.134.566.578	\$ 71.164.044	\$ 71.164.044
10.02	\$ 710.276.161	\$ 339.018.576	\$ 248.700.586	\$ 3.365.045	\$ 3.365.045
21.10.02	\$ 436.094.399	\$ 376.538.875	\$ 374.947.860	\$ 67.798.999	\$ 67.798.999
21.16.03	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



21.16.16	\$ 144.888.706	\$ 144.888.706	\$ 144.888.706	\$ 0	\$ 0
21.16.17	\$ 366.029.426	\$ 366.029.426	\$ 366.029.426	\$ 0	\$ 0
21.20.06	\$ 96.731.092	\$ 304.182	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIÓN:

El proyecto tiene un porcentaje de cumplimiento físico de 40% y ejecución financiera del 69% de acuerdo con el total de disponibilidades.

En el segundo (2) trimestre del 2019 se denota que los objetivos uno (1) y tres (3) se encuentran ya contratados y en ejecución.

Los objetivos dos (2) y cuatro (4) referentes a adquisición de equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la docencia, investigación y proyección social, se encuentran en etapa precontractual.

Se sugiere en el desarrollo de los procesos contractuales y de acuerdo con la resolución 710 del 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se resuelve que Colombia entrara en un proceso de actualización para la implementación del protocolo IPv6 en Colombia. Por lo cual, se debe tener en cuenta dicha nueva tecnología en la compra de los nuevos equipos para que puedan ser compatibles con las actualizaciones que se requieran.

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Formación y Cualificación Docente	CÓDIGO:	410.705.1.5.1
EJE DEL PDI:	Articulación y reposición de compromisos misionales; docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Desarrollo profesoral		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Incrementar los niveles de formación académica de los docentes a nivel de doctorado y maestría.		
FECHA DE VIABILIDAD	2019/03/14	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a junio 30 de 2019
COORDINADOR	Lyda Constanza Mora Mendieta		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	1		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Apoyar la formación de docentes de planta de la UPN a nivel de doctorado	Meta 1: Trece (13) docentes de planta de la UPN en formación a nivel de doctorado.	50%	50%	50%



3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)		35%	
Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 900.000.000	\$ 311.469.232	\$ 308.833.743	\$ 308.833.743	\$ 308.833.743
10.02	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.10.02	\$ 661.507.657	\$ 72.976.890	\$ 70.341.402	\$ 70.341.402	\$ 70.341.402
21.16.02	\$ 124.951.643	\$ 124.951.642	\$ 124.951.642	\$ 124.951.642	\$ 124.951.642
21.16.16	\$ 36.127.126	\$ 36.127.125	\$ 36.127.125	\$ 36.127.125	\$ 36.127.125
21.16.17	\$ 77.413.57	\$ 77.413.573	\$ 77.413.573	\$ 77.413.573	\$ 77.413.573

OBSERVACIÓN:

La ejecución presupuestal está ligada a los costos mensuales de la Comisiones docentes a nivel de doctorado aprobadas y vigentes, las cuales fueron respaldadas con recursos CREE. Se ha dado cumplimiento a la ejecución física y financiera acorde al objetivo planteado.

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento	CÓDIGO:	410.705.172
EJE DEL PDI:	EJE 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Apropiación social del Conocimiento y Comunicación Institucional		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Producir contenidos editoriales de alta calidad que estimulen la profesionalización docente y los desarrollos investigativos, académicos, artísticos, y didácticos, así como las innovaciones de ciencia y tecnología que aporten de manera creativa a las transformaciones sociales y culturales que requiere el país.		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Posicionar la Universidad Pedagógica Nacional como Líder en la formulación de propuestas educativas y pedagógicas para la construcción de una sociedad en paz, con justicia y democracia		
FECHA VIABILIDAD	01/02/2019	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a junio 30 de 2019
COORDINADOR	Alba Lucia Bernal Cerquera		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	4		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1: Coordinar y desarrollar la producción y publicación de los libros,	Meta 1: Producir y publicar 37 libros resultado de las convocatorias, alianzas	50%	58%	58%



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
revistas y documentos institucionales para su circulación y distribución.	editoriales y documentos institucionales.			
	Meta 2: Producir y publicar 37 números de las revistas científicas y académicas de la Universidad Pedagógica Nacional.	75%		
	Meta 3: Visibilizar y circular la producción editorial de la Universidad	50%		

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)	68 %
---------------------------------	---	------

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 344.011.077	\$ 232.467.570	\$ 217.563.426	\$ 148.215.246	\$ 148.215.246
21.10.02	\$ 344.011.077	\$ 232.467.570	\$ 217.563.426	\$ 148.215.246	\$ 148.215.246

OBSERVACIÓN:

La ejecución física del proyecto se encuentra en el 58 %, durante los primeros dos (2) trimestres del año 2019 se ha efectuado la convocatoria de publicación de libros 2019. Frente a las revistas se encuentran en producción 28, que se están trabajando en procesos de edición, reedición desde los años 2018 y 2019, se publicaron revistas en las pagina de la Universidad Pedagógica Nacional, se participó en la feria del libro 2019; se organizó la segunda feria Pedagógica del Libro. La ejecución financiera es del 68 % sobre el total de disponibilidades.

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Bienestar para todas y todos	CÓDIGO:	410.705.1.8.1
EJE DEL PDI:	Eje 1: Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	8. Universidad para la alegría.		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Fortalecer el Bienestar Universitario para garantizar un ambiente de convivencia y el ejercicio de derechos y vida digna para los integrantes de la comunidad universitaria.		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Fortalecer los programas de Bienestar Universitario los cuales redundan en pro de la calidad de vida de la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica.		
FECHA DE VIABILIDAD	22/03/2019	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a junio 30 de 2019
COORDINADOR	Crisanto Gómez Ráquira - Subdirección de Bienestar Universitario		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	1		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1: Amparar el reconocimiento económico de las y los estudiantes beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles - ASE para el período 2019-I, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 332 de 2004	Meta 1: Seleccionar 100 estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE para el periodo 2019-I.	100%	100%	50%
Objetivo 2: Amparar el reconocimiento económico de las y los estudiantes beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles - ASE para el período 2019-II, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 332 de 2004	Meta 1: Seleccionar 100 estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE para el periodo 2019-II.	0%	0%	

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)	50 %			
Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$332.700.000	\$ 166.948.697	\$ 165.821.948	\$ 89.304.056	\$ 49.885.748
10.02	\$ 11.231.496	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	\$ 288.768.504	\$ 166.818.419	\$ 165.821.948	\$ 89.304.056	\$ 49.885.748
21.10.02	\$ 30.000.000	\$ 119.522	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.17.02	\$ 2.700.000	\$ 10.756	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIÓN:

Dicho proyecto tiene una ejecución financiera del 50% y ejecución física con un porcentaje de cumplimiento del 50% frente al avance del proyecto se tiene que para el segundo trimestre se seleccionaron cien (100) estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE, los cuales cumplieron con la entrega del plan de trabajo y 68 cumplieron con la entrega del certificado equivalente al 50% del plan de trabajo.

Durante el tercer y cuarto trimestre del año 2019 se va a realizar la ejecución restante seleccionado 100 estudiantes más con el de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE.



1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Ampliación de la Movilidad de Profesores y Estudiantes	CÓDIGO:	410.705.3.2.1
EJE DEL PDI:	Universidad Sin Fronteras		
PROGRAMA DEL PDI:	La Universidad Pedagógica Nacional en el ámbito internacional		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Consolidar con otras universidades los vínculos e interacciones investigativas y académicas en torno al campo educativo y pedagógico, en el ámbito mundial, en particular del sur global y en perspectiva Latinoamérica		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Fortalecer las iniciativas académicas de internacionalización que se generan desde las distintas unidades académicas y que protagonizan los docentes, los investigadores y estudiantes a través de la integración de una dimensión internacional, intercultural e interdisciplinaria, que permiten visibilizar el quehacer de la Institución y su compromiso con la sociedad.		
FECHA DE VIABILIDAD	2019/01/25	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a junio 30 de 2019
COORDINADOR	Helberth Augusto Choachí González		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	RECTORÍA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA			3

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1: Fortalecer la participación de profesores, estudiantes e investigadores de la UPN en escenarios internacionales	Meta 1: Incrementar la movilidad internacional en un 2% de estudiantes de pregrado y de posgrado de la UPN en las universidades con las que existen convenios de cooperación	66%	56.25%	175 %
	Meta 2: Aumentar la movilidad en un 2% de docentes de la UPN en actividades internacionales	59%		
	Meta 3: Diseñar documentos que permitan la construcción de la política de internacionalización	50%		
	Meta 4: Crear un sistema de estímulo e incentivo para los docentes de la UPN que lideren proyectos de internacionalización que den como resultado recursos económicos y/o posicionamiento institucional en el ámbito internacional.	50%		
Objetivo 2: Promover la participación de profesores, estudiantes e investigadores de los países de la región y del mundo a la UPN	Meta 1: Ampliar en un 2% la asistencia de estudiantes extranjeros en los programas curriculares de pregrado y posgrado.	126%	101%	
	Meta 2: Incorporar a treinta y ocho (38) profesores o investigadores internacionales en los espacios académicos de los programas de la UPN.	76%		



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 3: Impulsar las actividades académicas e investigativas que promueven las distintas unidades.	Meta 1 : Apoyar la realización de 25 eventos promovidos por la comunidad académica de la UPN	104%	104%	
Objetivo 4: Diseñar una estrategia que visibilice el impacto de la movilidad de docentes	Meta 1: Visibilizar la movilidad internacional a través de la socialización de experiencias académicas investigativas durante el 2019.	100%	100%	
Objetivo 5: Fortalecer los mecanismos de cooperación con organismos y asociaciones nacionales e internacionales que permitan la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores	Meta 1: Gestionar y promover 3 nuevas alianzas estratégicas con asociaciones u organismos nacionales e internacionales.	933%	516%	
	Meta 2: Mantener actualizado el mini sitio de Internacionalización con las ofertas de movilidad con organismos internacionales	100%		

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)	66 %
---------------------------------	---	------

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 641.490.981	\$ 422.755.012	\$ 413.255.309	\$ 201.742.084	\$ 163.414.019
10.02	\$ 623.082.294	\$ 422.755.012	\$ 413.255.309	\$ 201.742.084	\$ 163.414.019
21.10.02	\$ 18.408.687	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIÓN:

El proyecto tiene una ejecución física superior al 100%, dando cumplimiento a sus objetivos y superando las metas planteadas inicialmente, la ejecución financiera tiene un porcentaje del 66 % superando la media esperada para la fecha de reporte del segundo trimestre del año 2019.



1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Renovación del Parque Automotor de la UPN	CÓDIGO:	410.750.1.4.3.
EJE DEL PDI:	Articulación y Reposicionamiento de compromisos misionales: Docencia, Investigación y Proyección Social		
PROGRAMA DEL PDI:	Maestros con Excelencia y Dignidad		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la universidad para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Brindar adecuada movilidad al equipo directivo de la Universidad Pedagógica Nacional (Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de gestión Universitaria, Vicerrectoría administrativa y Financiera y Secretaria General), renovando el equipo automotor, con el fin de atender oportunamente y con mayor efectividad los requerimientos de traslado terrestre a nivel urbano y rural, en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo		
COORDINADOR	ALEXANDER MORENO CÁRDENAS		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
FECHA DE VIABILIDAD	09/04/2019	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a junio de 2019
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	1		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1: Modernizar el parque automotor de la Universidad Pedagógica Nacional para garantizar la operación eficiente de la flota vehicular.	Meta1 : Adquirir en el presente año dos (2) buses de cuarenta (40) pasajeros y (1) una camioneta para la universidad	5%	5%	5%

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)			
		0%			
Este proyecto presenta la siguiente ejecución presupuestal:					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 363.984.953	\$ 321.450.139	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10.02	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.10.02	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.20.06	\$ 363.984.953	\$ 321.450.139	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIÓN:

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con los estudios previos y el borrador de los términos de referencia para la Convocatoria Pública que tiene por objeto adquisición de un (1) Bus de Cuarenta (40) pasajeros para la Universidad Pedagógica Nacional. Se espera respuesta de la gestión con la Cooperativa CODEMA, frente a la modificación del certificado emitido de distribución de aportes de la ejecución.

De Acuerdo a la gestiones efectuadas y respuestas que se dé por la parte de la Cooperativa se podrá efectuar la contratación durante el tercer (3) y/o cuarto (4) trimestre de año 2019. Por los factores anteriormente mencionados la ejecución física del proyecto es de (5%) y la ejecución financiera es del (0%).

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Dotación de Biblioteca	CÓDIGO:	410.705.1.4.2
TIPO DE PROYECTO:	Transversal con énfasis en los procesos misionales (Investigación, docencia y proyección social)		
EJE DEL PDI:	Articulación y reposición de compromisos misionales; docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Recursos de Apoyo Académico		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro papel como interlocutora del gobierno Nacional, en la definición y desarrollo de políticas educativas		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Suscribir acceso a contenidos a través de Bases de Datos Bibliográficas, de instrumentos tecnológicos para la consulta y reprografía, así como su adecuación para servicios más eficientes.		
FECHA DE VIABILIDAD	05/02/2019	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a junio 30 de 2019
COORDINADOR	Yaneth Romero Coca– Subdirectora de Biblioteca, documentación y recursos bibliográficos (E)		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	2		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 1: Suscribir el acceso a sistemas estadístico y servidor EZproxy web de control según el presupuesto asignado y de acuerdo a las necesidades priorizadas por la alta dirección.	Meta 1: Suscribir el acceso a sistema web que permite la administración de estadísticas	100%	70%	60%
	Meta 2: Suscribir el acceso a servidores EZproxy web de control de acceso a las Bases de Datos Bibliográficos	40%		
Objetivo 2: Suscribir el acceso a contenidos según el presupuesto asignado y de acuerdo a las necesidades priorizadas por la alta dirección.	Meta 1: Suscribir el acceso a contenidos de herramientas electrónicas a través de bases de Datos Bibliográficos	40%	40%	



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2019		
Objetivos II TRIM 2019	METAS II TRIM 2019	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Objetivo 3: Suscribir el servicio a la plataforma de Repositorio Institucional UPN.	Meta 1: Suscribir el servicio a la plataforma De Repositorio Institucional	70%	70%	

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (DISPONIBILIDAD)	43 %
---------------------------------	---	------

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 267.477.147	\$ 114.612.895	\$ 113.715.439	\$ 42.215.439	\$ 42.215.439
21.10.02	\$ 267.477.147	\$ 114.612.895	\$ 113.715.439	\$ 42.215.439	\$ 42.215.439

OBSERVACIÓN:

La ejecución física del proyecto fue del 60% y la ejecución financiera fue del 43% que corresponde en su mayoría al licenciamiento de las plataformas que requieren para la UPN, se han efectuado dichos cambios y procesos de acuerdo a la contratación, los demás software y aplicativos requeridos serán renovados para el tercer y cuarto trimestre del año.

Elaboró: María Fernanda Peña/Saida Gaitán

Revisó: Yaneth Romero Coca
